



Informe ejecutivo N° 10, revisión 0

Edificio HC2

Ampliación Clínica U Andes

Septiembre 2026

Cierre del período: 30-09-2026 · Emitido el
01-10-2026


Cliente	Constructora
Universidad de los Andes	CYPCO
Tipo de contrato	Código de proyecto
Suma alzada	GIP_267
Superficie	Plazo contractual
12.596,30 m²	10-11-2025 al 04-05-2027



Vista aérea de la obra, 21-09-2026

Dónde está la obra al cierre de septiembre 2026

Con el 60,0% del plazo transcurrido, la obra lleva 26,3% ejecutado: 2,18 pp bajo el programa, equivalente a 9 días de atraso. Lo certificado en estados de pago (29,0%) va 2,71 pp sobre el avance físico.

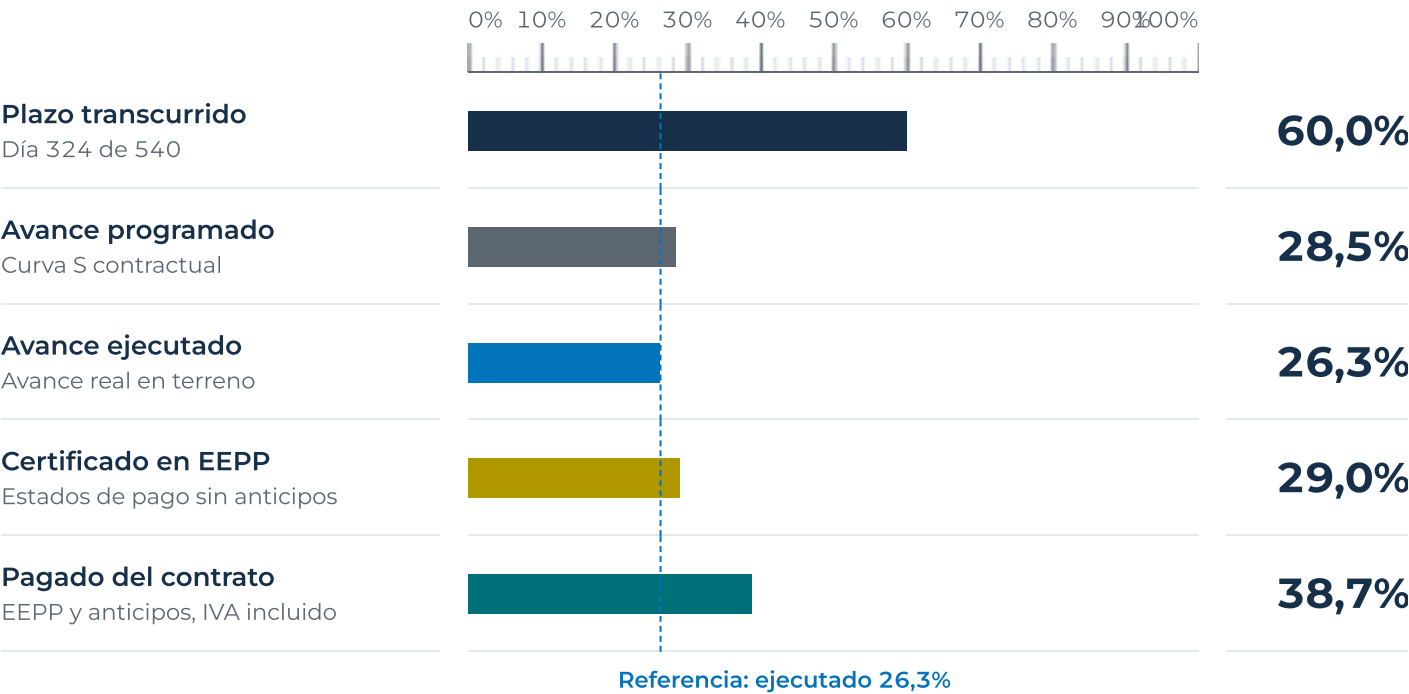

Semáforo de gestión

Rojo	Avance físico vs programa Ejecutado 26,3% vs programado 28,5% (-2,18 pp, 9 días de atraso)
Amarillo	Avance certificado en EEPP vs físico Certificado en estados de pago 29,0% vs avance físico 26,3% (+2,71 pp)
Amarillo	Hitos contractuales 3 de 11 hitos cumplidos, todos en fecha o antes. El hito 4 (término de obra gruesa de la losa cielo del piso 5) vence el 06-11-2026 con la obra 9 días atrasada
Verde	Vigencia de garantías Boletas de anticipo (12-07-2027 y 27-08-2027) y póliza (26-07-2027) vigentes después del término, 04-05-2027
Verde	Obras adicionales Aprobados UF 12.330,01 con IVA (2,12% del contrato); 8 solicitudes en revisión por UF 2.738,13
Verde	Cierre de RDI Tasa de cierre 95,7%, con 17 pendientes de 391; 10 de ellas con plazo de respuesta vencido
Amarillo	Seguridad Incidente sin lesionados el 11-09; el 24-09 se reanudaron las labores en el sector paralizado por el accidente grave del 18-08

Contrato y garantías

Contrato a suma alzada con CYPCO, por 582.764 UF IVA incluido y un plazo de 540 días. Restan 216 días para el término, el 04-05-2027.

● Verde: vigencia de garantías

Cliente	Universidad de los Andes	Fecha de inicio	10-11-2025
Constructora	CYPCO	Fecha de término	04-05-2027

Descripción de la obra	Ampliación Clínica U Andes, Edificio HC2	Plazo de ejecución	540 días
Tipo de contrato	Suma alzada	Días restantes	216 días
Tipo de obra	Construcción	Plazo transcurrido	60,0%
Código	GIP_267	Desviación	9 días de atraso
Superficie	12.596,30 m²	Monto del contrato (IVA incl.)	582.763,87 UF

Composición del monto contratado

Concepto	UF	% del neto
Costo directo	380.339,00	77,7%
Gastos generales (14,1% del costo directo)	53.776,74	11,0%
Utilidades (5,8% del costo directo)	22.211,80	4,5%
Valores proforma	31.500,00	6,4%
Administración de valores proforma (6%)	1.890,00	0,4%
Monto neto	489.717,54	100,0%
IVA (19%)	93.046,33	19,0%
Monto total del contrato (IVA incl.)	582.763,87	119,0%

El anexo A.1 registra el contrato actualizado en 582.446,97 UF, por el ajuste de los valores proforma a 31.248,77 UF (detalle en obras adicionales).

Póliza de seguro

Aseguradora	N° de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Reale Seguros	700011211	Todo riesgo de construcción y responsabilidad civil	628.972 UF	27-10-2025 al 26-07-2027

La póliza vence 83 días después del término contractual (04-05-2027).

Garantías y retenciones

Anticipos otorgados (neto) 73.457,63 UF 48.971,75 UF (10%) y 24.485,88 UF (5%)	Anticipo amortizado 25,4% 18.631,62 UF devueltos en EEPP	Por amortizar 54.826,02 UF Saldo neto de los anticipos	Retenido a la fecha 7.096,67 UF 24,4% de la retención contractual
--	---	---	--



Anticipo N° 1 (10%): 17 de 25 boletas en poder de la inmobiliaria (41.279,23 UF). 8 con devolución aprobada por 16.997,16 UF.



Anticipo N° 2 (5%): 11 de 12 boletas en poder de la inmobiliaria (27.471,60 UF). 1 con devolución aprobada por 1.666,60 UF.

Institución	N° de boleta	Concepto	Vencimiento	Monto	Estado
Banco Consorcio	6600088366 a 6600088512	Anticipo N° 1 (16 boletas)	12-07-2027	38.017,59 UF	7 con devolución aprobada, 9 en poder de la inmobiliaria
BancoEstado	17568349 a 17568357	Anticipo N° 1 (9 boletas)	12-07-2027	20.258,80 UF	1 con devolución aprobada, 8 en poder de la inmobiliaria
Banco Consorcio	6600091864 a 6600091939	Anticipo N° 2 (8 boletas)	27-08-2027	20.187,03 UF	En poder de la inmobiliaria
BancoEstado	17629054 a 17629057	Anticipo N° 2 (4 boletas)	27-08-2027	8.951,17 UF	1 con devolución aprobada, 3 en poder de la inmobiliaria
—	—	Retención contractual (5% del monto total)	—	29.138,19 UF	7.096,67 UF retenidos a la fecha

Las boletas del anticipo N° 1 vencen 69 días después del término contractual (04-05-2027) y las del anticipo N° 2, 115 días después. Montos de boletas con IVA incluido; fuente: anexo A.2.

Avance físico

Ejecutado 26,27% contra 28,45% programado: 9 días de atraso. Para terminar en plazo se necesitan 10,3 puntos de avance por mes.

● Rojo: avance físico vs programa


Programado a la fecha 28,45% Curva S contractual	Ejecutado a la fecha 26,27% Avance real en terreno	Desviación -2,18 pp 9 días de atraso
---	---	---

Avance mensual

Avance necesario para terminar en plazo

10,3 puntos

Por mes hasta el término (04-05-2027); faltan 73,73%

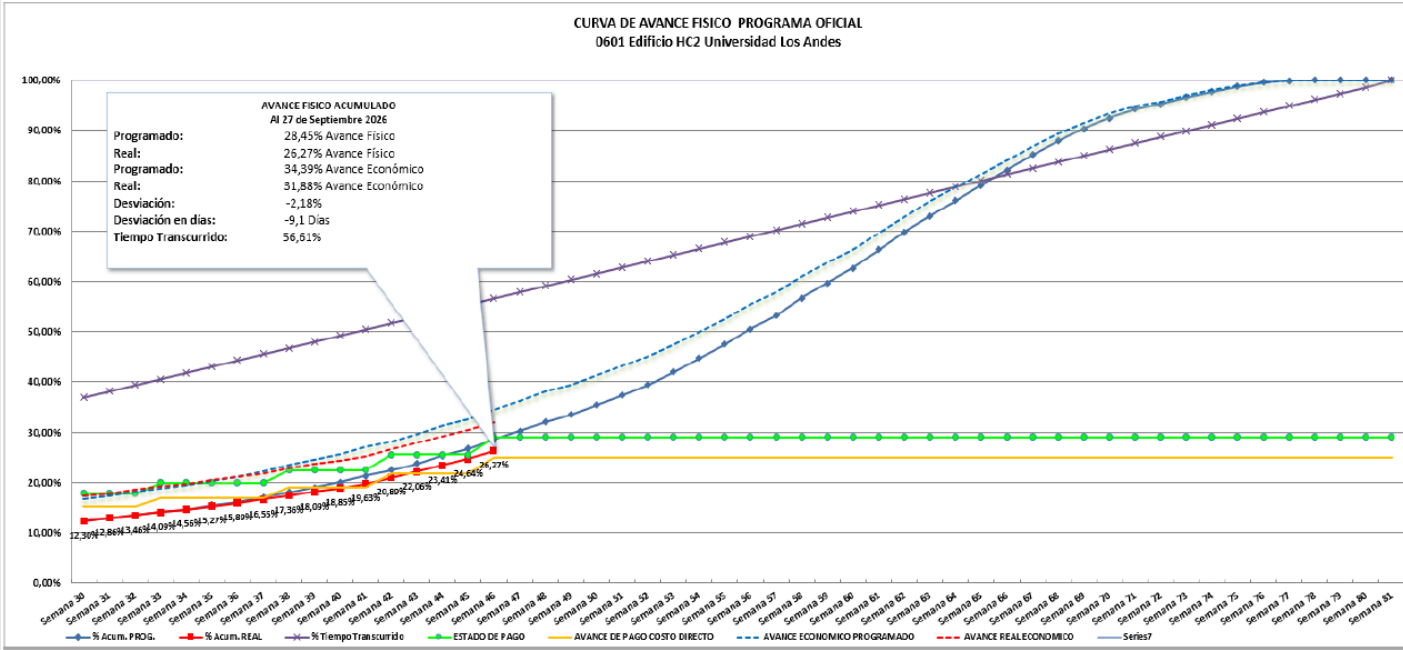

Curva S de avance físico al 27-09-2026, programa oficial. Azul: % acumulado programado. Rojo: % acumulado real. Morado: tiempo transcurrido. Verde: estado de pago. Líneas segmentadas: avance económico programado y real.

El avance económico al 27-09-2026 es 31,88% real contra 34,39% programado. El recuadro de la curva informa 56,61% de tiempo transcurrido según la escala semanal del programa; este informe usa los días calendario del contrato (día 324 de 540). Al cierre quedan 73,73% de obra por ejecutar en 216 días.

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 38,7% del contrato (225.699 UF IVA incluido, con 87.415 UF de anticipos). Quedan 357.065 UF por pagar.

● Amarillo: avance certificado en EEPP vs físico

15,0%	23,7%	61,3%
Anticipos	Estados de pago	Saldo por pagar
87.415 UF	138.284 UF	357.065 UF
15,0% del contrato	23,7% del contrato	61,3% del contrato

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	582.763,87 UF	—	100,0%
Monto neto del contrato	489.717,54 UF	—	84,0%
Anticipos facturados (IVA incl.)	87.414,58 UF	—	15,0%

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Estados de pago facturados (IVA incl., neto de devoluciones y retenciones)	138.284,08 UF	—	23,7%
Pagado en estados de pago y anticipos	225.698,67 UF	\$ 9.038.438.430	38,7%
Saldo por pagar (IVA incl.)	357.065,20 UF	—	61,3%
Obras adicionales aprobadas (IVA incl.)	12.330,01 UF	—	2,1%

El saldo por pagar incluye las retenciones acumuladas (7.096,67 UF netas). Las obras adicionales se pagan aparte, en estados de pago de notas de cambio.

Avance físico frente al financiero


Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	28,45%	Curva S contractual
Avance ejecutado a la fecha	26,27%	Avance real en terreno
Desviación física	-2,18 pp	9 días de atraso
Avance certificado en estados de pago	28,98%	141.933 UF brutos en EEPP, sin anticipos, sobre el monto neto
Brecha certificado vs físico	+2,71 pp	Fuera de ±2 pp: lo certificado va por delante del avance físico
Avance económico real (curva S)	31,88%	Programado 34,39% al 27-09-2026
Anticipo amortizado	25,4%	Devolución proporcional en cada estado de pago
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	38,73%	IVA incluido
Plazo transcurrido	60,0%	Día 324 de 540

Estados de pago

En el período se cursó el EEPP N° 11 (factura N° 106279), por 16.238,86 UF IVA incluido (\$ 666.057.563). El 24-09 se aprobó el estado de pago N° 11 por avance y documentación.

Estados de pago 11 Último emitido: EEPP N° 11, 16-09-2026	Anticipos cursados 2 73.457,63 UF netos	Facturado en el período 16.238,86 UF \$ 666.057.563	Pagado acumulado 38,73% 225.698,67 UF IVA incluido
--	--	--	---

Facturado por mes y pagado acumulado

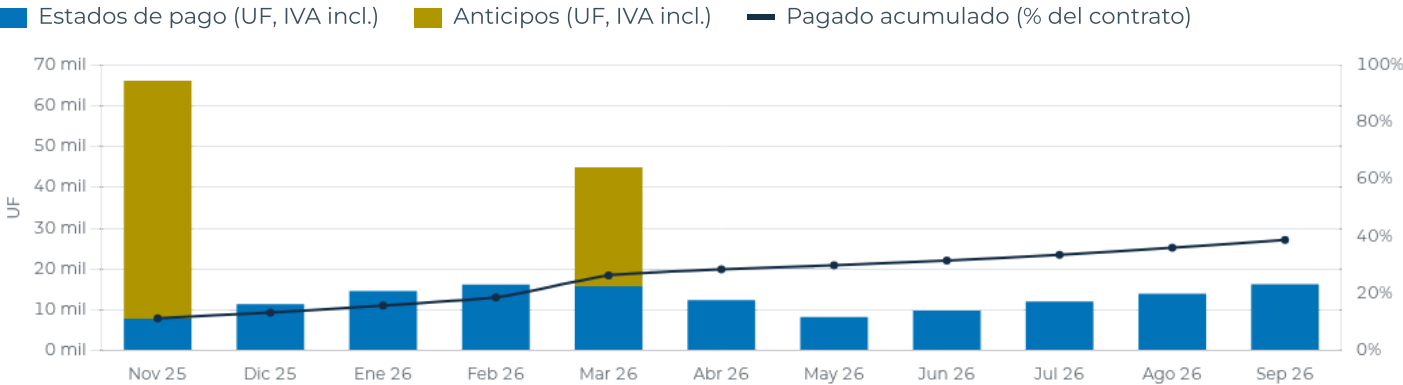

Concepto	UF	Detalle
Monto bruto facturado	215.391,03	Estados de pago y anticipos
Devolución de anticipos	-18.631,62	25,4% de los anticipos amortizado
Retenciones	-7.096,67	5% de cada estado de pago
Monto neto	189.662,75	
IVA (19%)	36.035,92	
Total pagado (IVA incl.)	225.698,67	38,73% del contrato · \$ 9.038.438.430

Detalle de los 13 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
Anticipo N° 1	12-11-2025	106057	48.971,75	—	—	58.276,39	10,0%
EEPP N° 1	21-11-2025	106067	7.719,15	771,92	385,96	7.807,92	11,3%
EEPP N° 2	19-12-2025	106086	11.226,55	1.122,66	561,33	11.355,66	13,3%
EEPP N° 3	20-01-2026	106107	14.420,82	1.442,08	721,04	14.586,66	15,8%
EEPP N° 4	23-02-2026	106125	15.987,09	1.598,71	799,35	16.170,94	18,6%
EEPP N° 5	20-03-2026	106149	15.586,77	1.558,68	779,34	15.766,02	21,3%
Anticipo N° 2	27-03-2026	100152	24.485,88	—	—	29.138,20	26,3%
EEPP N° 6	22-04-2026	106175	13.134,54	2.070,60	656,73	12.384,58	28,4%
EEPP N° 7	26-05-2026	106195	8.718,15	1.374,37	435,91	8.220,37	29,8%
EEPP N° 8	22-06-2026	106210	10.379,44	1.636,27	518,97	9.786,80	31,5%

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
EEPP N° 9	20-07-2026	106235	12.728,80	2.006,63	636,44	12.002,02	33,5%
EEPP N° 10	21-08-2026	106258	14.809,88	2.334,71	740,49	13.964,26	35,9%
EEPP N° 11	16-09-2026	106279	17.222,21	2.715,00	861,11	16.238,86	38,7%
Total			215.391,03	18.631,62	7.096,67	225.698,67	38,7%

Fuente: anexo A.3, estados de pago ordinarios con IVA normal, visado por GIP. Fechas de emisión de factura.

Obras adicionales

La constructora ha presentado 38 notas de cambio por 21.299,52 UF con IVA. Se han aprobado 26 por 12.330,01 UF (2,12% del contrato); 8 siguen en revisión por 2.738,13 UF y 4 fueron rechazadas. No se cursaron estados de pago de notas de cambio en el período.

● Verde: obras adicionales

Presentado (IVA incl.) 21.299,52 UF 38 notas de cambio	Aprobado (IVA incl.) 12.330,01 UF 2,12% del contrato	Facturado 6.892,15 UF 4 estados de pago de notas de cambio	Saldo por facturar 5.437,86 UF Del monto aprobado
---	---	---	--

● 26 aprobadas ● 8 en revisión ● 4 rechazadas

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
1	Ceremonia	Improductividad por ceremonia de primera piedra (22-12-2025)	258,96	103,65	40%	Aprobado
2	Cálculo	Balance de fierro vs. APC	8.186,81	8.063,50	98%	Aprobado
3	Cálculo	Muro adicional CF tipo 4, 6 y MC4	217,18	201,00	93%	Aprobado
4	Cálculo	Cambio de patas de 15 cm por horquillas en losa de fundación	14,90	14,90	100%	Aprobado
5	Topografía	Sobrerrelleno de talud	145,85	—	—	Rechazado
6	Mecánica de suelos	Balance de pilas	311,42	228,28	73%	Aprobado
7	Luminarias	Balance de luminarias	478,77	-129,09	—	Aprobado
8	Artefactos	Balance de artefactos	-1.161,31	-1.161,31	—	Aprobado

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
9	RCA	Gestión de permiso Seremi para bodega de residuos peligrosos	33,15	33,15	100%	Aprobado
10	RCA	Medición de ruido	128,89	—	—	Observado por ITO
11	RDI	Zócalo según RDI N° 263	358,56	352,81	98%	Aprobado
12	RCA	Gestión de permiso Seremi para residuos no peligrosos	21,42	21,42	100%	Aprobado
13	Sanitario	Cambio de colector ALL	624,03	307,62	49%	Aprobado
14	Puertas	Balance de puertas de madera	-63,65	-36,68	—	Aprobado
15	Control centralizado	Disminución del control centralizado (upgrade)	-1.087,75	-2.203,27	—	Aprobado
16	Arquitectura	Balance de junta de dilatación	2.561,75	1.877,24	73%	Aprobado
17	Arquitectura	Balance de puertas automáticas	2.091,72	601,63	29%	Aprobado
18	Arquitectura	Balance de tabique vidriado y ventanas	981,71	-171,46	—	Aprobado
19	Arquitectura	Balance de tabique, guardamuros y esquineros	517,33	493,58	95%	Aprobado
21	Seguridad	Balance PCI del subterráneo 2	80,27	29,65	37%	Aprobado
22	Sanitario	PVC hidráulico para condensado de equipo 2	50,25	—	—	Rechazado
23	Electricidad	Canalizaciones de CCTV y BMS por cambio de revisión de planos APC, subterráneo 2	235,73	181,31	77%	Aprobado
24	Arquitectura	Sobrelosa etapa 2	1.103,41	1.103,41	100%	Aprobado
25	Sanitario	Conexión de matriz de agua potable en cobre	271,62	250,89	92%	Aprobado
26	Cálculo	Fierro VI 40-60 en altillo	53,55	53,55	100%	Aprobado
27	Arquitectura	Ventanas de fachada	571,71	571,71	100%	Aprobado
28	Cálculo	Fierro de losa de escalera N° 1, nivel S.M.	9,47	9,47	100%	Aprobado
29	Correo neumático	Proforma de correo neumático	1.486,03	1.486,03	100%	Aprobado
30	Electricidad	Balance de instalación eléctrica APC vs. licitación, niveles -2 y -1	299,56	—	—	En revisión ITO

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
31	Sanitario	ALL APC vs. licitación, niveles -2 y -1	47,28	47,02	99%	Aprobado
32	Seguridad	Sensor de humo según RDI N° 315	261,73	—	—	En revisión ITO
33	Clima	Tintas penetrantes, subterráneo 1	46,31	—	—	En revisión ITO
34	Seguridad	Desarme y modificación de ramales, nivel -1	19,71	—	—	Rechazado
35	Seguridad	Balance por modificación del proyecto de seguridad, licitación vs. APC	1.917,64	—	—	En revisión ITO
36	Seguridad	Sistema de extinción NOVEC para tablero eléctrico (RDI 344)	141,52	—	—	Rechazado
37	Arquitectura	Balance de terminaciones de subterráneos	-36,72	—	—	En revisión ITO
38	Sanitario	Modificación del recorrido de agua potable, edificio existente, climatización	52,36	—	—	En revisión Proyecta
39	Seguridad	Modificación de planos PCI, licitación vs. APC, nivel -1	68,36	—	—	En revisión ITO
Total con IVA			21.299,52	12.330,01	58%	

Montos en UF con IVA incluido; fuente: anexo A.4.1. Los balances negativos son disminuciones de obra. El N° 20 no figura en el listado.

Estados de pago de notas de cambio

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Retención	IVA	Total (UF)
EEPP NDC 1	26-05-2026	106196	2.265,40	-113,27	408,90	2.561,03
EEPP NDC 2	22-06-2026	106211	2.494,18	-124,71	450,20	2.819,67
EEPP NDC 3	20-07-2026	106236	1.039,12	-51,96	187,56	1.174,73
EEPP NDC 4	21-08-2026	106259	297,85	-14,89	53,76	336,72
Total			6.096,55	-304,83	1.100,43	6.892,15

Total pagado \$ 280.671.286. Fuente: anexo A.4.

Valores proforma

El contrato incluye 31.500,00 UF en valores proforma. A la fecha solo se ha resuelto el correo neumático, aprobado por 1.248,77 UF frente a 1.500,00 UF estimadas, con lo que el monto actualizado queda en 31.248,77 UF.

N°	Partida	Estimado inicial (UF)	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	Actualizado (UF)
1	Limpiafachadas	5.000,00	—	—	5.000,00
2	Paisajismo	7.000,00	—	—	7.000,00
3	Parking	1.500,00	—	—	1.500,00
4	Llamado de enfermería	10.000,00	—	—	10.000,00
5	Correo neumático	1.500,00	2.748,77	1.248,77	1.248,77
6	Ascensores	6.500,00	—	—	6.500,00
Total		31.500,00	2.748,77	1.248,77	31.248,77

Fuente: anexo A.4 (RVP).

Requerimientos de información (RDI)

De 391 RDI emitidas, 374 están resueltas (95,7%). Quedan 17 pendientes; 10 ya superaron su plazo de respuesta.

● Verde: cierre de RDI

RDI emitidas 391 7 nuevas en la última semana	Resueltas 374 Tasa de cierre 95,7%	Pendientes 17 4,3% del total	Con plazo vencido 10 Al cierre del período
--	---	---	---

Estado de las RDI

Resueltas		374 95,7%
Pendientes en plazo		7 1,8%
Pendientes con plazo vencido		10 2,6%

RDI pendientes al 30-09-2026

N°	Tema	Especialidad	Responsable	Consulta	Plazo	Días	Estado
43	Plano del proyecto de enfermería	Proyecta	Proyecta	04-12-2025	22-12-2025	300	Vencida
355	Validación de válvula motorizada de fan coil	Clima	GIP	03-08-2026	23-08-2026	58	Vencida
357	Espacio para protecciones en tablero categoría 5	Eléctrica	GIP	06-08-2026	26-08-2026	55	Vencida

N°	Tema	Especialidad	Responsable	Consulta	Plazo	Días	Estado
358	Validación de bombas de recirculación de agua caliente	Eléctrica	GIP	06-08-2026	26-08-2026	55	Vencida
362	Pileta de sala de basura y aseo	Sanitaria	GIP	12-08-2026	31-08-2026	49	Vencida
368	CPI de habitaciones	CPI	GIP	18-08-2026	07-09-2026	43	Vencida
371	Incongruencia entre arquitectura y proyecto de sala de basuras	Proyecta	Proyecta	24-08-2026	13-09-2026	37	Vencida
376	Pruebas de aceptación de rociadores	PCI	GIP	31-08-2026	20-09-2026	30	Vencida
380	Matrices de clima del subterráneo 1	Clima	GIP	02-09-2026	22-09-2026	28	Vencida
383	Fan coil de la sala eléctrica del nivel -2	Clima	GIP	07-09-2026	27-09-2026	23	Vencida
385	Altura de accionador de WC y llave de paso en recintos	Arquitectura	AGE y Arq	24-09-2026	13-10-2026	6	En plazo
386	Incongruencia de lavamanos en box de examen 1 a 4	Arquitectura	AGE y Arq	24-09-2026	13-10-2026	6	En plazo
387	Color de cielo baffle	Arquitectura	AGE y Arq	24-09-2026	13-10-2026	6	En plazo
388	Ubicación de TAIH en ductos	PCI	GIP	24-09-2026	14-10-2026	6	En plazo
389	Diferencia de rociadores entre plano de cielos y PCI, piso 1	PCI	GIP	24-09-2026	14-10-2026	6	En plazo
390	Llaves de corte para sectorizar matrices de agua fría y caliente	Sanitaria	GIP	24-09-2026	14-10-2026	6	En plazo
391	Conexión de elemento de estructura metálica del piso mecánico	Cálculo	VMB	24-09-2026	14-10-2026	6	En plazo

Responsables de respuesta: GIP (11), AGE y Arq (3), Proyecta (2), VMB (1). Días en consulta contados al cierre del período.
Fuente: estatus de RFI.

Calidad y seguridad

Se formalizan las respuestas a RDI en Procore, se revisa con la constructora el plan de inspección y ensayos y se entrega el informe de calidad N° 2. En seguridad hubo un incidente sin lesionados y la Dirección del Trabajo autorizó la reanudación de labores en el sector paralizado por el accidente grave de agosto.

● Amarillo: seguridad

Calidad de obra

- Se formalizan las respuestas a RDI mediante el software Procore, con gestión ante calculistas, arquitectos y especialidades.
- Se revisan con la constructora las partidas del plan de inspección y ensayos (PIE) de obra gruesa y terminaciones. Se trabaja en el de instalaciones.
- Se mantiene actualizado el control de certificados de botaderos.
- Se elabora el informe de calidad N° 2, entregado a la constructora el 15-09.
- Se trabaja junto a la constructora en el protocolo de instalación de porcelanato.

Seguridad e higiene

Incidentes en el mes 1 11-09, sin lesionados	Accidente grave 18-08-2026 Caída a desnivel, mes anterior
Reanudación de labores 24-09-2026 Acta de la Dirección del Trabajo	Capacitaciones 4 Trabajadores de CYPKO y subcontrato TYP

Gestión de seguridad del período

- El 11-09 la constructora informa un incidente (altercado) en el piso 4, durante labores de moldaje, sin lesionados.
- El 24-09 la Dirección del Trabajo emite el acta de reanudación de labores del sector paralizado por el accidente grave del 18-08-2026.
- Sesiona el comité paritario de higiene y seguridad de la obra.
- La supervisión de seguridad en terreno es permanente, con corrección inmediata por la constructora.
- Se da cumplimiento al DS 594; según la constructora, el cálculo se hace con la asistencia de obra.
- Mejoras en terreno: malla perimetral en andamios, perfiles de soporte para líneas de vida y señalética.
- Capacitaciones: uso de extintores y andamios para el subcontrato TYP, uso de tronadora y pistola Hilti para CYPKO, y charla de prevención de alcohol y drogas a cargo de la asistente social.
- Se envían a la constructora observaciones de seguridad, orden y aseo, y se solicita usar en terreno la pantalla acústica móvil.

Hitos y hechos relevantes

Se han cumplido 3 de los 11 hitos, todos en su fecha o antes. El próximo es el término de la obra gruesa de la losa cielo del piso 5, programado para el 06-11-2026, con la obra 9 días atrasada. Los hitos 8 a 11 (puesta en marcha y recepción municipal) están programados después del término contractual.

● Amarillo: hitos contractuales

Hitos contractuales



- 1** Llegada de aisladores

Cumplido el 15-12-2025, en la fecha programada (15-12-2025) · No forma parte del contrato
- 2** Autorización de conexión con el edificio existente

Cumplido el 28-01-2026, 4 días antes de lo programado (01-02-2026) · No forma parte del contrato
- 3** Obra gruesa de la losa cielo del subterráneo 2

Cumplido el 20-04-2026, 10 días antes de lo programado (30-04-2026)
- 4** Término de obra gruesa de la losa cielo del piso 5

06-11-2026, día 361 · Próximo hito
- 5** Término de obra gruesa de la conexión con el edificio existente, ejes 7 y K

04-01-2027, día 420
- 6** Término de instalaciones y terminaciones de los niveles 1 y 2

31-03-2027, día 506
- 7** Término de instalaciones y terminaciones de los niveles 3 y 4

30-04-2027, día 536
- 8** Inicio de la puesta en marcha

10-05-2027, día 546
- 9** Entrega de instalaciones operativas


17-05-2027, día 553
- 10** Documentación para la recepción municipal

25-05-2027, día 561
- 11** Término de la puesta en marcha

31-05-2027, día 567

Los hitos rellenos están cumplidos y se ubican en su fecha real. La línea segmentada marca el término contractual (04-05-2027, día 540); los hitos 8 a 11 quedan después de esa fecha.

Hechos relevantes de septiembre 2026



- 1** 02-09-2026 El mandante informa que designará un día a la semana para visitar las instalaciones de la obra.

- ② 02-09-2026 Proyecta informa que entregó a la constructora los planos con las definiciones de pinturas. De las dos muestras presentadas en el subterráneo, la clínica aprueba la de pintura semibrillo.
- ③ 03-09-2026 El comité paritario de la clínica visita la obra.
- ④ 15-09-2026 Reunión entre la asesora de la clínica y el proyectista de la constructora: el proyectista enviará la documentación escaneada para su ingreso al sistema en línea de la Seremi de Salud.
- ⑤ 16-09-2026 La constructora incorpora al programa de intervenciones las entregas acordadas: P2 y P3 (bodega de pabellones) el 20-10 y P5 (kinesiología) el 16-11.
- ⑥ 16-09-2026 La constructora programa las conexiones de matrices de agua potable del subterráneo 1 entre el 01-10 y el 22-10.
- ⑦ 16-09-2026 La constructora informa que prevé retirar la grúa N° 2 el 15-10.
- ⑧ 19-09-2026 La clínica y la inspección reciben conforme el cierre de mitigación presentado por la constructora. La empresa Perfogon iniciará los cortes.
- ⑨ 21-09-2026 La constructora envía el procedimiento de instalación de enchape de fachadas e inicia esos trabajos.
- ⑩ 21-09-2026 La constructora envía el procedimiento de instalación de porcelanato; la inspección trabaja con ella en el protocolo.
- ⑪ 22-09-2026 Personal de la clínica evalúa en obra tres alternativas de ubicación del correo neumático en farmacia y recepción. Se acuerda la opción 1 (ejes K.7 con 12.1) del nivel 1.
- ⑫ 23-09-2026 Visita del calculista por problemas de fraguado en los ejes K7 y O.2.
- ⑬ 24-09-2026 Visita del inspector de la Dirección del Trabajo, que emite el acta de reanudación de labores tras el accidente grave del 18-08-2026.
- ⑭ 24-09-2026 Se aprueba el estado de pago N° 11 (avance y documentación).
- ⑮ 30-09-2026 El proyecto de basuras está en proceso de aprobación para su ingreso a la Seremi de Salud, gestionado por Proyecta.
- ⑯ 30-09-2026 La clínica aprueba los retranqueos de los niveles 4 y 5, con lo que se pueden liberar 6 habitaciones.

Documentos anexos al informe

03-09-2026 Visita del comité paritario de la clínica

08-09-2026 Observaciones de obra

11-09-2026 Incidente en obra


15-09-2026	Informe de calidad N° 2
23-09-2026	Visita del calculista por problema de fraguado
24-09-2026	Acta de reanudación de labores (accidente grave del 18-08-2026)
29-09-2026	Observaciones de obra

Los documentos anexos se incluyen en el informe original en Excel.

Registro fotográfico al 30-09-2026

15 fotografías del período, agrupadas por frente de trabajo. Seleccione una foto para ampliarla.

Obra gruesa 6 fotos



Losa cielo nivel 3 oriente

Foto 1. Avance de postensado, 04-09-2026



Losa cielo nivel 3 oriente

Foto 2. Avance de plataba, 04-09-2026



Losa cielo nivel 4 poniente

Foto 3. Avance de moldaje, 10-09-2026




Losa cielo nivel 4 central

Foto 7. Avance de postensado, 21-09-2026



Losa cielo nivel 4 central


Foto 8. Avance de postensado, vista aérea, 21-09-2026



Losa

Foto 13. Recepción de pasadas sanitarias, 28-09-2026

Instalaciones 4 fotos




Nivel -1

Foto 11. Avance de canalizaciones eléctricas, 25-09-2026




Nivel 1

Foto 12. Avance de escaleras eléctricas, 25-09-2026



Conexión con edificio existente

Foto 14. Avance de red hidrónica AC/AF, 28-09-2026



Conexión con edificio existente


Foto 15. Avance de red hidrónica AC/AF, 28-09-2026

Terminaciones 2 fotos



Subterráneo

Foto 9. Avance de instalación de porcelanato, 23-09-2026



Subterráneo


Foto 10. Avance de instalación de porcelanato, 24-09-2026

Fabricación en taller 3 fotos




Taller Tecmel

Foto 4. Revisión del avance de fabricación de tableros, 16-09-2026



Taller Tecmel

Foto 5. Pruebas de componentes de tableros, 16-09-2026



Taller Tecmel

Foto 6. Pruebas de componentes de tableros, 16-09-2026



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago
contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 10, revisión 0

Ampliación Clínica U Andes, Edificio HC2 (GIP_267)

Período septiembre 2026, cierre 30-09-2026
